


Planlagte tiltak i forbindelse med finanskrisen Helse Vest RHF

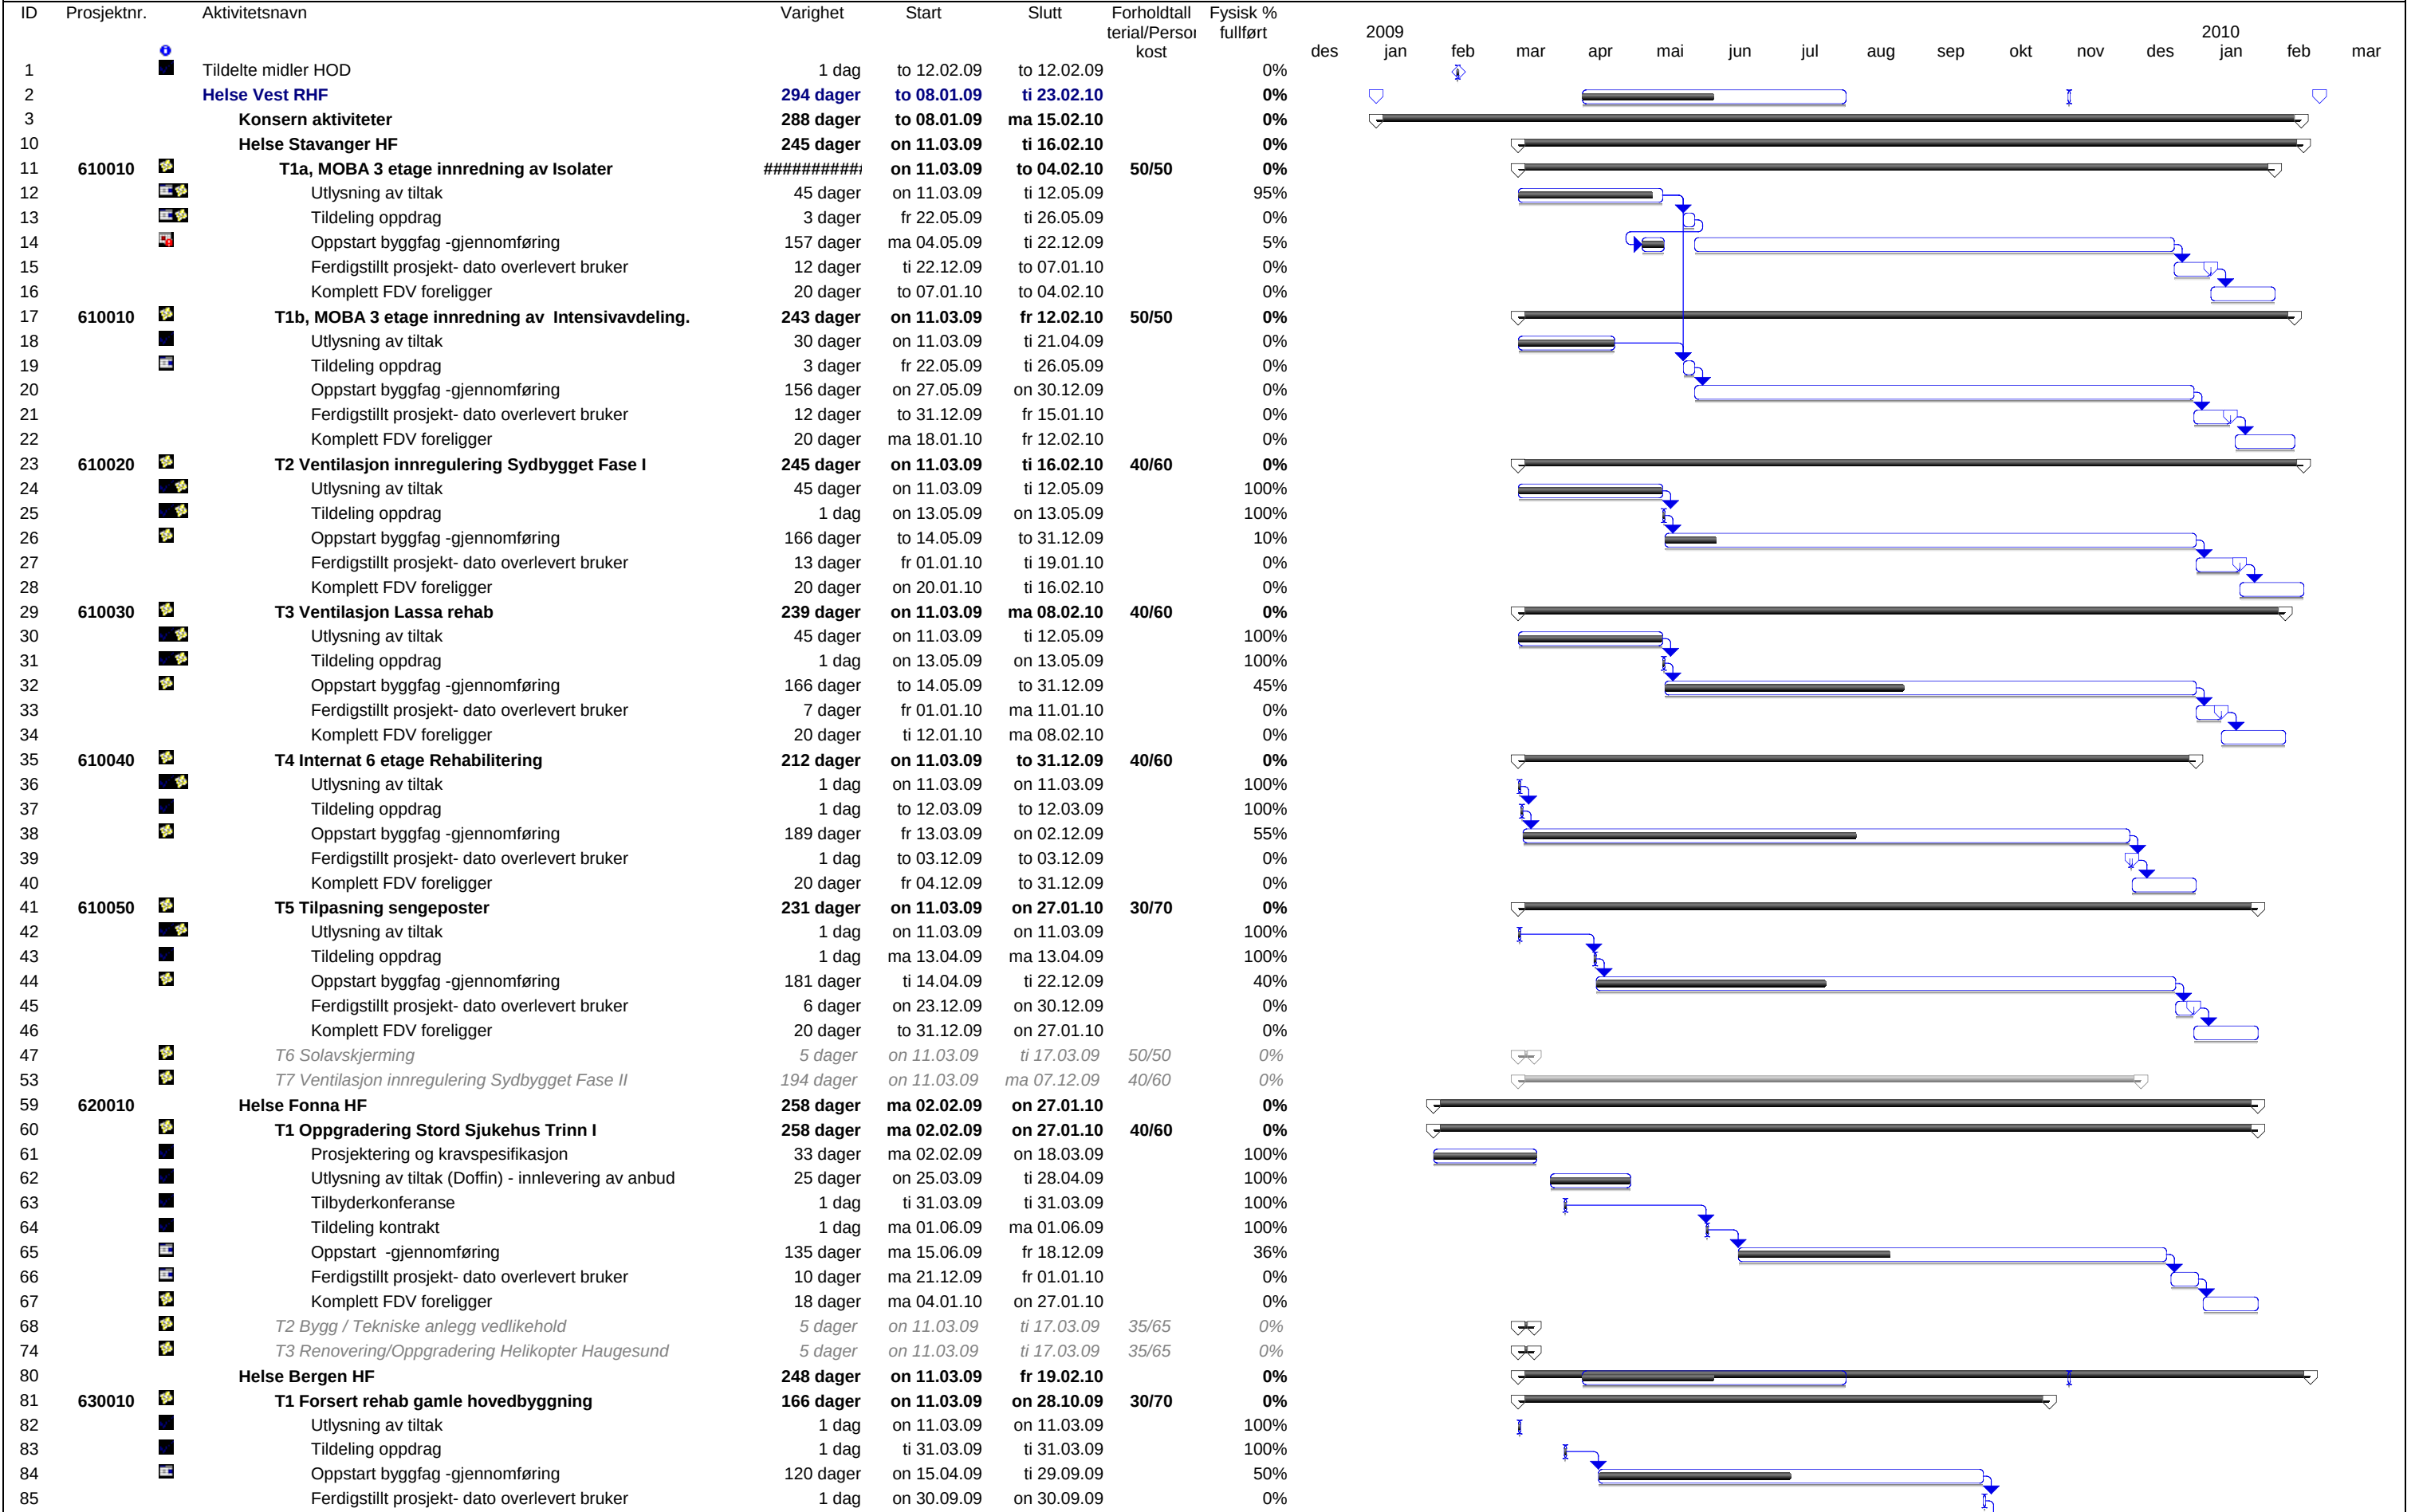

Prosjekt: Plan oppfølging av prosj
Dato: fr 11.09.09

Aktivitet

Fremdrift

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Ekst

Aktivitet

Deling

Fremdrift

Planlagte tiltak i forbindelse med finanskrisen Helse Vest RHF

ID	Prosjektnr.	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Forholdtall terial/Person kost	Fysisk % fullført	des	2009 jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2010 jan	feb	mar
86		 Komplett FDV foreligger	20 dager	to 01.10.09	on 28.10.09		0%																
87	630020	 T2 Skifte yttertak	69 dager	on 11.03.09	ma 15.06.09	30/70	0%																
88		 Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
89		 Tildeling oppdrag	10 dager	to 12.03.09	on 25.03.09		100%																
90		 Oppstart byggfag -gjennomføring	30 dager	fr 01.05.09	to 11.06.09		100%																
91		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	fr 12.06.09	fr 12.06.09		100%																
92		 Komplett FDV foreligger	1 dag	ma 15.06.09	ma 15.06.09		100%																
93	630030	 T3 Rehab innv/utv av flere bygg på gården Floen	104 dager	on 11.03.09	ma 03.08.09	30/70	0%																
94		 Utlysning av tiltak	7 dager	on 11.03.09	to 19.03.09		100%																
95		 Tildeling oppdrag	10 dager	ma 23.03.09	fr 03.04.09		100%																
96		 Oppstart byggfag -gjennomføring	50 dager	ma 27.04.09	fr 03.07.09		90%																
97		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	ma 06.07.09	ma 06.07.09		0%																
98		 Komplett FDV foreligger	20 dager	ti 07.07.09	ma 03.08.09		0%																
99		 Malerarbeid	83 dager	on 08.04.09	fr 31.07.09		50%																
100		 Priser inn	1 dag	on 08.04.09	on 08.04.09		100%																
101		 Utførelse	50 dager	ma 25.05.09	fr 31.07.09		50%																
102	630040	 T4 Brannteknisk oppgrad gamle hovedbygg	196 dager	fr 24.04.09	fr 22.01.10	40/60	0%																
103		 Utlysning av tiltak	1 dag	fr 24.04.09	fr 24.04.09		100%																
104		 Tildeling oppdrag	33 dager	ma 25.05.09	on 08.07.09		100%																
105		 Oppstart byggfag -gjennomføring	119 dager	to 09.07.09	ti 22.12.09		20%																
106		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	3 dager	on 23.12.09	fr 25.12.09		0%																
107		 Komplett FDV foreligger	20 dager	ma 28.12.09	fr 22.01.10		0%																
108																							
109	630050	 T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak Voss	182 dager	ti 12.05.09	on 20.01.10	30/70	0%																
110		 Utlysning av tiltak	1 dag	ti 12.05.09	ti 12.05.09		100%																
111		 Tildeling oppdrag	14 dager	on 13.05.09	ma 01.06.09		100%																
112		 Oppstart byggfag -gjennomføring	100 dager	ma 03.08.09	fr 18.12.09		50%																
113		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	3 dager	ma 21.12.09	on 23.12.09		0%																
114		 Komplett FDV foreligger	20 dager	to 24.12.09	on 20.01.10		0%																
115	630060	 T6 Branntekninsk oppgrad Dr. Martens	133 dager	on 11.03.09	fr 11.09.09	40/60	0%																
116		 Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
117		 Tildeling oppdrag	6 dager	to 12.03.09	to 19.03.09		100%																
118		 Oppstart byggfag -gjennomføring	50 dager	fr 27.03.09	to 04.06.09		99%																
119		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	fr 14.08.09	fr 14.08.09		0%																
120		 Komplett FDV foreligger	20 dager	ma 17.08.09	fr 11.09.09		0%																
121	630070	 T7 Brannteknisk oppgradering Sengekorset	204 dager	on 25.03.09	ma 04.01.10	40/60	0%																
122		 Utlysning av tiltak	30 dager	on 25.03.09	ti 05.05.09		100%																
123		 Tildeling oppdrag	5 dager	on 06.05.09	ti 12.05.09		100%																
124		 Oppstart byggfag -gjennomføring	90 dager	ma 17.08.09	fr 18.12.09		10%																
125		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	ma 21.12.09	ma 21.12.09		0%																
126		 Komplett FDV foreligger	10 dager	ti 22.12.09	ma 04.01.10		0%																
127	630080	 T8 Forsering utskifte lysamatur	199 dager	on 08.04.09	ma 11.01.10	10/90	0%																
128		 Utlysning av tiltak	19 dager	on 08.04.09	ma 04.05.09		100%																
129		 Tildeling oppdrag	20 dager	ti 05.05.09	ma 01.06.09		100%																
130		 Oppstart byggfag -gjennomføring	150 dager	ma 18.05.09	fr 11.12.09		20%																
131		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	ma 14.12.09	ma 14.12.09		0%																
132		 Komplett FDV foreligger	20 dager	ti 15.12.09	ma 11.01.10		0%																
133	630090	 T9 IKT datakabling renovering modernisering	207 dager	on 11.03.09	to 24.12.09	40/60	0%																
134		 Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
135		 Tildeling oppdrag	20 dager	ma 04.05.09	fr 29.05.09		100%																
136		 Oppstart byggfag -gjennomføring	123 dager	ma 01.06.09	on 18.11.09		20%																
137		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	6 dager	to 19.11.09	to 26.11.09		0%																
138		 Komplett FDV foreligger	20 dager	fr 27.11.09	to 24.12.09		0%																
139	630100	 T10 Sandviken etablering av Akutt ruspost	203 dager	on 11.03.09	fr 18.12.09	40/60	0%																
140		 Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
141		 Tildeling oppdrag	25 dager	to 12.03.09	on 15.04.09		100%																
142		 Oppstart byggfag -gjennomføring	144 dager	ma 04.05.09	to 19.11.09		60%																
143		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	fr 20.11.09	fr 20.11.09		0%															</	

Prosjekt: Plan oppfølging av prosj
Dato: fr 11.09.09

Aktivitet

Fremdrift

Sammendrag

Ekst

Aktivitet

Fremdrift

Deling

Milepæl

Prosjektsammendrag

Deling

Planlagte tiltak i forbindelse med finanskrisen Helse Vest RHF

ID	Prosjektnr.	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Forholdtall terial/Person kost	Fysisk % fullført	des	2009 jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2010 jan	feb	mar
145	639110	T11 Sentraloperasjon utbedringer, sluser, økt kapasitet	168 dager	on 11.03.09	fr 30.10.09	40/60	0%																
146		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
147		Tildeling oppdrag	40 dager	to 12.03.09	on 06.05.09		100%																
148		Oppstart byggfag -gjennomføring	62 dager	on 01.07.09	to 24.09.09		25%																
149		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	6 dager	fr 25.09.09	fr 02.10.09		0%																
150		Komplett FDV foreligger	20 dager	ma 05.10.09	fr 30.10.09		0%																
151	630120	T12 Gamle hovedbygg, nevrolog tilrettelegging	193 dager	on 11.03.09	fr 04.12.09	40/60	0%																
152		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
153		Tildeling oppdrag	1 dag	to 12.03.09	on 22.04.09		100%																
154		Oppstart byggfag -gjennomføring	141 dager	to 23.04.09	to 05.11.09		80%																
155		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	fr 06.11.09	fr 06.11.09		0%																
156		Komplett FDV foreligger	20 dager	ma 09.11.09	fr 04.12.09		0%																
157	630130	T13 Gangbro fra SB til Amauer Hansen hus	248 dager	on 11.03.09	fr 19.02.10	50/50	0%																
158		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
159		Tildeling oppdrag	37 dager	to 12.03.09	fr 01.05.09		100%																
160		Oppstart byggfag -gjennomføring	189 dager	ma 04.05.09	to 21.01.10		1%																
161		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	fr 22.01.10	fr 22.01.10		0%																
162		Komplett FDV foreligger	20 dager	ma 25.01.10	fr 19.02.10		0%																
163	630140	T14 Riving av hudbygget, tilrettelegge av nye arealer	192 dager	on 11.03.09	to 03.12.09	10/90	0%																
164		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		80%																
165		Tildeling oppdrag	100 dager	to 12.03.09	on 29.07.09		60%																
166		Oppstart byggfag -gjennomføring	68 dager	ma 03.08.09	on 04.11.09		20%																
167		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	to 05.11.09	to 05.11.09		0%																
168		Komplett FDV foreligger	20 dager	fr 06.11.09	to 03.12.09		0%																
169		T15 KK rehab tak, vinduer fasade	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	30/70	0%																
175		T16 Utskifte varmepumpen	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	60/40	0%																
181		T17 Ny veibelysning m/tavle og styring	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	40/60	0%																
187		T18 Utsifting VVS tavler	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	50/50	0%																
193		T19 Nye ventilasjonsanlegg 2 stk	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	50/50	0%																
199		Helse Førde HF	234 dager	on 11.03.09	ma 01.02.10		0%																
200	640010	T1 Lærdal Brannoppgradering	230 dager	on 11.03.09	ti 26.01.10	30/70	0%																
201		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
202		Tildeling oppdrag	13 dager	to 12.03.09	ma 30.03.09		100%																
203		Oppstart byggfag -gjennomføring	186 dager	ti 31.03.09	ti 15.12.09		45%																
204		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	7 dager	lø 19.12.09	ti 29.12.09		0%																
205		Komplett FDV foreligger	20 dager	on 30.12.09	ti 26.01.10		0%																
206	640020	T2 Oppgradering Tronvik	234 dager	on 11.03.09	ma 01.02.10	40/60	0%																
207		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
208		Tildeling oppdrag	29 dager	to 12.03.09	ti 21.04.09		100%																
209		Oppstart byggfag -gjennomføring	74 dager	ma 14.09.09	to 24.12.09		0%																
210		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	7 dager	fr 25.12.09	ma 04.01.10		0%																
211		Komplett FDV foreligger	20 dager	ti 05.01.10	ma 01.02.10		0%																
212	640030	T3 Vedlikeholdsprosjekt 3	172 dager	on 11.03.09	to 05.11.09	40/60	0%																
213		Utlysning av tiltak	21 dager	on 11.03.09	on 08.04.09		100%																
214		Tildeling oppdrag	15 dager	to 09.04.09	on 29.04.09		100%																
215		Oppstart byggfag -gjennomføring	110 dager	to 30.04.09	on 30.09.09		70%																
216		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	6 dager	to 01.10.09	to 08.10.09		0%																
217		Komplett FDV foreligger	20 dager	fr 09.10.09	to 05.11.09		0%																
218																							
219		T4 Lærdal oppgradering 3 etg Kirurgisk	190 dager	ma 11.05.09	fr 29.01.10	40/60	0%																
225		T5 Operasjon 8 FSS	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	70/30	0%																
231		T6 Ombygging støtteareal operasjon FSS	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	50/50	0%																
237		T7 Microbiologisk avdeling FSS	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	60/40	0%																
243		Helse Vest IKT as	212 dager	on 11.03.09	to 31.12.09		0%																
250		Private Ideelle selskap	250 dager	on 11.03.09	ti 23.02.10		0%																
251	650110	T1 Haraldsplass, Ombyggingsarbeider eks. bygg	212 dager	on 11.03.09	to 31.12.09	40/60	0%																
252		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%																
253		Tildeling oppdrag	1 dag	to 12.03.09	to 12.03.09		80%																
254		Oppstart byggfag -gjennomføring	182 dager	fr 13.03.09	ma 23.11.09		60%																

Prosjekt: Plan oppfølging av prosj
Dato: fr 11.09.09

Aktivitet

Fremdrift

Sammendrag

Ekst

Aktivitet

Fremdrift

Deling

Milepæl

Prosjektsammendrag

Deling

Planlagte tiltak i forbindelse med finanskrisen Helse Vest RHF

ID	Prosjektnr.	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Forholdtall terial/Person kost	Fysisk % fullført	2009 des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010 jan feb mar											
255	650210	 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	8 dager	ti 24.11.09	to 03.12.09	40/60	48%												
256		 Komplette FDV foreligger	20 dager	fr 04.12.09	to 31.12.09		0%												
257		 T2 HSR Rehabilitering eks. bygg	250 dager	on 11.03.09	ti 23.02.10		0%												
258		 Utlysning av tiltak	29 dager	on 11.03.09	ma 20.04.09		95%												
259		 Tildeling oppdrag	17 dager	ti 21.04.09	on 13.05.09		80%												
260		 Oppstart byggfag -gjennomføring	177 dager	to 14.05.09	fr 15.01.10		60%												
261		 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	7 dager	ma 18.01.10	ti 26.01.10		50%												
262		Komplette FDV foreligger	20 dager	on 27.01.10	ti 23.02.10		21%												
263																			
264		Apotekene Vest	4 dager	on 11.03.09	ma 16.03.09		0%												

